









































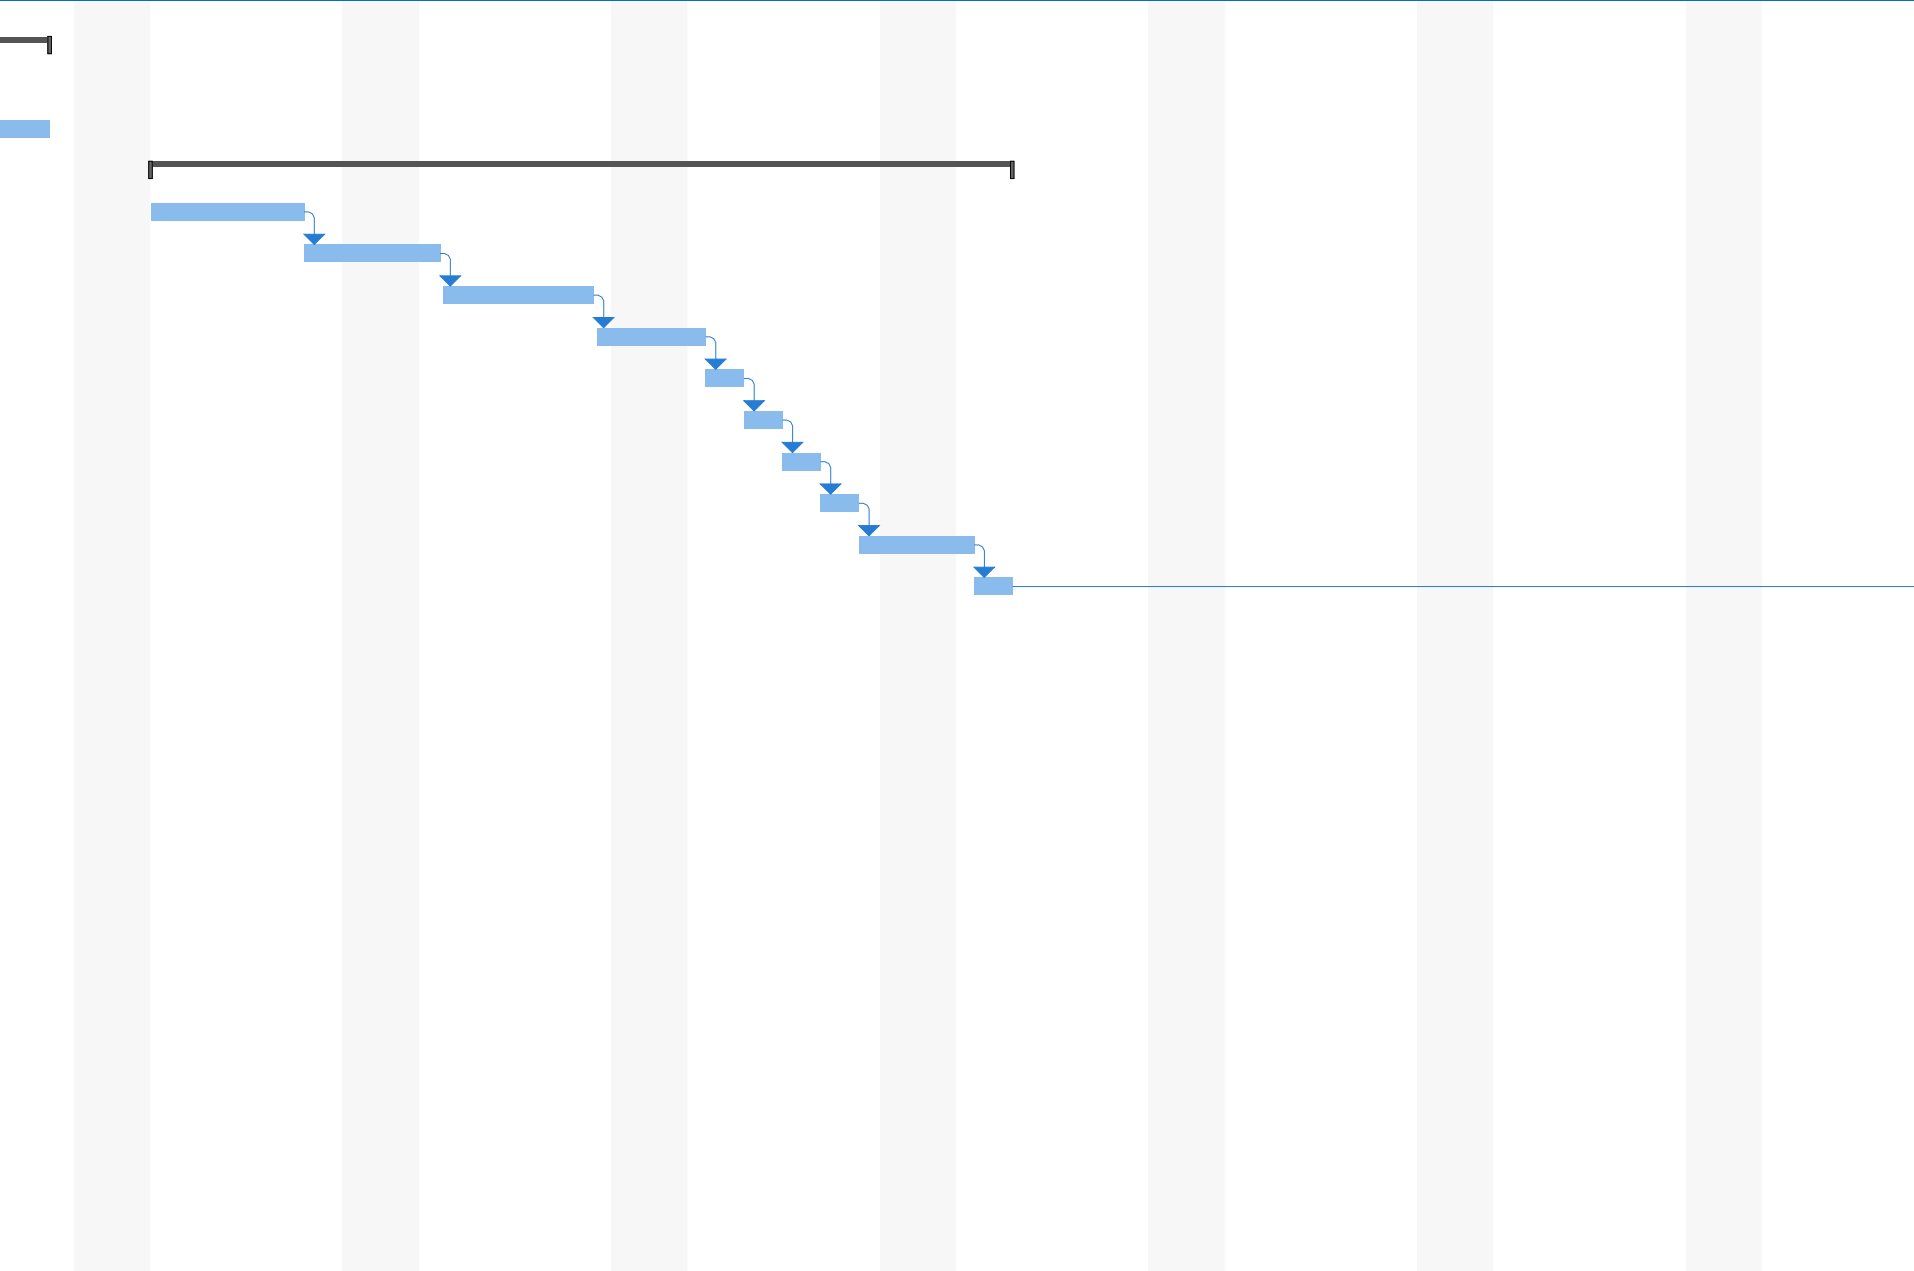


Id		% completado	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	09 may '16				
									S	D	L	M	X
1		0%		<b>OT 25290 Armado GFA 350 Komatsu</b>	0%	<b>73,51 días</b>	<b>lun 09-05-16</b>	<b>jue 18-08-16</b>					
2		0%		<b>Activar Subcontrato y Compras</b>	0%	<b>4,01 días</b>	<b>lun 09-05-16</b>	<b>vie 13-05-16</b>					
3		0%		Comprar repuestos	0%	0,1 horas	lun 09-05-16	lun 09-05-16					
4		0%		Metalizados	0%	32 horas	lun 09-05-16	vie 13-05-16					
5		0%		<b>Mecanizado</b>	0%	<b>16,25 días</b>	<b>lun 16-05-16</b>	<b>mar 07-06-16</b>					
6		0%		Mecanizado carcasa de entrada	0%	32 horas	lun 16-05-16	jue 19-05-16					
7		0%		Fabricar camisa	0%	12 horas	vie 20-05-16	lun 23-05-16					
8		0%		Mecanizado final carcasa de entrada	0%	32 horas	lun 23-05-16	vie 27-05-16					
9		0%		Mecanizado Alojamiento anillo porta rodamiento	0%	6 horas	vie 27-05-16	lun 30-05-16					
10		0%		Fabricar camisa	0%	8 horas	lun 30-05-16	mar 31-05-16					
11		0%		Mecanizado final anillo porta rodamiento	0%	8 horas	mar 31-05-16	mié 01-06-16					
12		0%		Mecanizado tapa de salida	0%	8 horas	mié 01-06-16	jue 02-06-16					
13		0%		Fabricar camisa	0%	8 horas	jue 02-06-16	vie 03-06-16					
14		0%		Mecanizado final tapa de salida	0%	8 horas	vie 03-06-16	lun 06-06-16					
15		0%		Rectificado tapa de salida	0%	8 horas	lun 06-06-16	mar 07-06-16					
16		0%		<b>Armado</b>	0%	<b>10,75 días</b>	<b>lun 01-08-16</b>	<b>lun 15-08-16</b>					
17		0%		Limpieza de todos los componentes	0%	40 horas	lun 01-08-16	vie 05-08-16					
18		0%		Revisar repuestos	0%	4 horas	lun 08-08-16	lun 08-08-16					
19		0%		Dar ajustes a conjunto de entrada	0%	8 horas	lun 08-08-16	mar 09-08-16					
20		0%		preparar porta satelites	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16					
21		0%		Montar disco axial	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16					
22		0%		Preparar porta planetarios	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16					
23		0%		Preparar componentes para armado de piñones	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16					
24		0%		montar rodamiento en piñón	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
25		0%		Montar piñón armado en puño porta satelite	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
26		0%		Posicionar porta planetario	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
27		0%		Montar rodamiento en pista porta planetario	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
28		0%		Posicionar piñón planetario y montar rodamiento	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
29		0%		Montar piñones en porta planetario	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
30		0%		Invertir conjunto de salida ensamblado	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					
31		0%		Montar piñón solar	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16					

Id		% comple	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completac	Duración	Comienzo	Fin	09 may '16				
									S	D	L	M	X
32		0%		Montar conjunto porta planetario intermedio en	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
33		0%		Montar anillo	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
34		0%		posicione anillo dentado con dentado hacia arriba	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
35		0%		Montar anillo porta rodamiento	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
36		0%		Montar conjunto porta planetrio en anillo dentado	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
37		0%		Montar cubierta de salida	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
38		0%		Montar sellos de alojamiento de tapa	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
39		0%		Montar tapa porta sellos	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16					
40		0%		Montaje conjunto masa corona	0%	2 horas	vie 12-08-16	vie 12-08-16					
41		0%		Montar cubierta	0%	1 hora	vie 12-08-16	vie 12-08-16					
42		0%		Montar conjunto de entrada	0%	2 horas	vie 12-08-16	vie 12-08-16					
43		0%		Dar juego Backlash	0%	5 horas	vie 12-08-16	lun 15-08-16					
44		0%		Montar caja porta eje de entrada	0%	3 horas	lun 15-08-16	lun 15-08-16					
45		0%		Montar tapa axial	0%	1 hora	lun 15-08-16	lun 15-08-16					
46		0%		<b>Prueba</b>	0%	<b>1 día</b>	<b>lun 15-08-16</b>	<b>mar 16-08-16</b>					
47		0%		Preparar equipo para prueba	0%	5 horas	lun 15-08-16	mar 16-08-16					
48		0%		Realizar prueba y tomar controles de T° y RPM	0%	2 horas	mar 16-08-16	mar 16-08-16					
49		0%		Instalar machones	0%	1 hora	mar 16-08-16	mar 16-08-16					
50		0%		<b>Informe</b>	0%	<b>0,75 días</b>	<b>mar 16-08-16</b>	<b>mié 17-08-16</b>					
51		0%		Emitir informe final	0%	6 horas	mar 16-08-16	mié 17-08-16					
52		0%		<b>Pintado y embalaje</b>	0%	<b>1,76 días</b>	<b>mar 16-08-16</b>	<b>jue 18-08-16</b>					
53		0%		Pintado y secado de equipo	0%	8 horas	mar 16-08-16	mié 17-08-16					
54		0%		Pintar atril	0%	2 horas	mié 17-08-16	mié 17-08-16					
55		0%		Montar equipo en atril	0%	2 horas	jue 18-08-16	jue 18-08-16					
56		0%		Plastificar	0%	2 horas	jue 18-08-16	jue 18-08-16					
57		0%		Sacar fotografías de despacho	0%	0,1 horas	jue 18-08-16	jue 18-08-16					



[illegible]

V S D 04 jul '16 L M X J V S D 11 jul '16 L M X J V S D 18 jul '16 L M X J V S D 25 jul '16 L M X J V S D 01 ago '16 L M X J V S D 08 ago '16 L M X J V S D 15 ago '16 L M X J V

